DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE LEADS PARA LA FERIA DEL AUTOMÓVIL

Scrum Entrega Final – Massironi

Planteamiento del Problema

La participación de La Feria del Automóvil en eventos presenciales genera un alto volumen de consultas y potenciales clientes. Sin embargo, actualmente:

- No existe un sistema digital estructurado de registro.
- La captación de leads es manual o poco trazable.
- No se mide correctamente el origen del contacto.
- No hay integración con herramientas analíticas.
- Se pierden oportunidades comerciales por falta de seguimiento.

El problema central es la **falta de una solución digital que permita capturar, organizar, analizar y convertir los leads generados durante la feria**.

Propuesta de Solución Digital

Se propone el desarrollo de una plataforma web denominada **“Feria Auto Leads”**, que permita la captación digital de:

- Captación digital de leads.
- Clasificación automática de interés.
- Integración con CRM.
- Medición analítica en tiempo real.
- Seguimiento post-evento.

La feria física se convierte en un punto de generación de tráfico hacia una solución digital centralizada.

Objetivo General

Desarrollar e implementar una solución digital que optimice la captación, gestión y conversión de leads generados durante la Feria del Automóvil, integrando analítica y automatización comercial.

Objetivos Específicos

- Diseñar una landing page exclusiva para la feria.
- Implementar formulario digital con validación automática.
- Integrar la plataforma con GA4 y sistema de métricas.
- Clasificar leads según nivel de interés.
- Automatizar seguimiento post-evento.
- Medir tasa de conversión y rendimiento por canal.

Producto Digital Propuesto

Plataforma Web “Feria Auto Leads”

Funcionalidades principales:

1. Landing page responsive con información destacada.
2. Formulario digital con validación.
3. Clasificación automática de interés (modelo, presupuesto, financiación).
4. Generación de base de datos centralizada.
5. Integración con CRM.
6. Integración con Google Analytics 4.
7. Dashboard básico de métricas.
8. QR dinámico en el stand para acceso inmediato.

Marco Metodológico

El proyecto se desarrollará bajo el marco Scrum, con iteraciones de dos semanas, permitiendo entregas incrementales y mejora continua.

Equipo Agile del Proyecto

Product Owner (PO) – Gerente Comercial
Es el responsable de definir la visión del producto y maximizar su valor para el negocio. Se encarga de gestionar y priorizar el Product Backlog, asegurando que el equipo trabaje en las funcionalidades más relevantes según las necesidades del cliente y los objetivos comerciales. Además, valida los incrementos desarrollados en cada Sprint y toma decisiones estratégicas sobre el producto.

Scrum Master – Coordinador Digital
Actúa como facilitador del equipo Scrum, asegurando la correcta implementación de la metodología ágil. Su función principal es eliminar impedimentos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, promover la comunicación entre los miembros del equipo y garantizar que se respeten los eventos y prácticas de Scrum. También fomenta la mejora continua y la autoorganización del equipo.

UX/UI Designer
Es responsable del diseño de la experiencia de usuario y de la interfaz de la plataforma digital. Se encarga de crear wireframes, prototipos y flujos de navegación que aseguren una interacción intuitiva, eficiente y centrada en el usuario. Su trabajo es clave para optimizar la usabilidad del sistema y mejorar la conversión en el proceso de registro de leads.

Desarrollador Web
Se encarga del desarrollo técnico de la plataforma, incluyendo la implementación del frontend y backend. Es responsable de integrar el formulario digital, la base de datos, el sistema de registro de leads y las funcionalidades definidas en el backlog. También asegura el correcto funcionamiento, rendimiento y seguridad del sistema.

Analista BI (Business Intelligence)
Tiene como función diseñar y gestionar la estructura de datos del sistema, asegurando que la información recolectada sea organizada, accesible y útil para la toma de decisiones. Además, desarrolla dashboards e informes que permiten analizar el comportamiento de los leads y el rendimiento del proyecto.

Especialista en Analítica Digital
Es responsable de la medición y análisis de los datos generados por la plataforma. Se encarga de configurar herramientas como Google Analytics 4, definir eventos y métricas clave, y monitorear el comportamiento de los usuarios. Su rol es fundamental para evaluar el desempeño del sistema y optimizar la estrategia digital basada en datos.

MVP (Producto Mínimo Viable)

El MVP del proyecto “Feria Auto Leads” consiste en una versión inicial funcional de la plataforma digital que permite validar el proceso de captación de leads.

Este MVP incluye los componentes necesarios para asegurar el funcionamiento básico del sistema:

- **Landing page funcional:** accesible mediante QR, con información clara y acceso al registro.
- **Formulario digital:** permite al usuario cargar sus datos de manera rápida y sencilla.
- **Base de datos:** almacena automáticamente la información de los leads generados.
- **Evento de conversión en GA4:** registra los leads para su medición.
- **Dashboard básico:** visualiza la cantidad de registros y métricas iniciales.

El objetivo del MVP es verificar que el flujo completo funcione correctamente, desde el ingreso del usuario hasta el almacenamiento y medición del lead. Esto permite validar la solución en un entorno real y obtener información para mejorar en los siguientes hitos del proyecto.

Product Backlog

HU1 – Landing Page

Como visitante de la feria, quiero acceder a una landing page clara y accesible mediante un código QR, para obtener información relevante sobre los modelos disponibles y sus características.

Tareas:

- Diseño de wireframe y estructura de la interfaz (UX/UI Designer)
- Desarrollo de la interfaz frontend (Desarrollador Web)
- Integración de la landing page con el formulario de registro (Desarrollador Web)

Responsable: UX/UI Designer / Desarrollador Web
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 3 días

Criterios de aceptación:

- La landing page es responsive y se adapta a distintos dispositivos
- El tiempo de carga es menor a 3 segundos
- Incluye un botón de registro visible y accesible
- La información de modelos es clara y comprensible

HU2 – Formulario Digital

Como visitante, quiero completar un formulario digital simple y rápido, para recibir asesoramiento personalizado sobre los vehículos de mi interés.

Tareas:

- Diseño del formulario y experiencia de usuario (UX/UI Designer)
- Implementación de validación de campos obligatorios (Desarrollador Web)
- Integración del formulario con la base de datos (Desarrollador Web)

Responsable: Desarrollador Web
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- Todos los campos obligatorios son validados correctamente

- Los datos ingresados se registran sin errores en la base de datos
- El usuario recibe confirmación de envío del formulario
- El formulario es fácil de completar y no presenta fricciones

HU3 – Base de Datos de Leads

Como empresa, quiero almacenar automáticamente los datos de los leads generados, para asegurar la trazabilidad de la información y facilitar el seguimiento comercial.

Tareas:

- Diseño de la estructura de la base de datos (Analista BI)
- Desarrollo e integración del backend (Desarrollador Web)
- Pruebas de almacenamiento y consistencia de datos

Responsable: Analista BI
Equipo: Desarrollo
Prioridad: Alta
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- Los datos se almacenan correctamente y sin pérdidas
- La información es accesible en tiempo real
- La base de datos permite futuras integraciones con CRM
- Se garantiza la integridad y consistencia de los datos

HU6 – Métricas y Google Analytics 4

Como gerente, quiero medir la cantidad de leads generados y el comportamiento de los usuarios, para evaluar el rendimiento de la plataforma y tomar decisiones basadas en datos.

Tareas:

- Configuración de Google Analytics 4 (Especialista en Analítica Digital)
- Definición e implementación del evento “lead generado”
- Validación y verificación de métricas

Responsable: Especialista en Analítica Digital
Equipo: Marketing / Data
Prioridad: Media
Estimación: 2 días

Criterios de aceptación:

- El evento de conversión se registra correctamente en GA4
- Los datos son visibles en el dashboard
- Las métricas reflejan el comportamiento real de los usuarios
- Se pueden identificar conversiones y fuentes de tráfico

Sprint Backlog (Sprint 1 – MVP)

Sprint Goal:
Desarrollar la base funcional de captación digital de leads, asegurando el correcto funcionamiento de la plataforma inicial.

Tareas seleccionadas:

- Diseño de la experiencia de usuario de la landing page
- Desarrollo de la interfaz frontend
- Integración del sistema backend
- Configuración de herramientas de analítica (GA4)
- Ejecución de pruebas funcionales

Definition of Done:

- La plataforma se encuentra publicada y accesible
- La base de datos funciona correctamente
- Las métricas están configuradas y operativas
- El sistema ha sido probado en distintos dispositivos
- El flujo de registro de leads es funcional de extremo a extremo

Roadmap del Proyecto

Duración total estimada: 8 semanas

Definición del Roadmap del Proyecto

El roadmap del proyecto representa la planificación estratégica del desarrollo de la plataforma digital “Feria Auto Leads”, permitiendo visualizar la evolución del producto a lo largo del tiempo y los incrementos funcionales que se entregarán en cada etapa. En el marco de metodologías ágiles, el roadmap no funciona como un cronograma rígido, sino como una guía de alto nivel que organiza las funcionalidades principales del producto y los hitos del proyecto.

Para este proyecto se establecieron distintos sprints de trabajo que permiten desarrollar progresivamente la solución digital. En el **Sprint 1** se plantea el desarrollo del MVP, que incluye la creación de la landing page, el formulario digital de registro de leads y la implementación de métricas básicas mediante herramientas de analítica. Este primer incremento permite validar la captación de leads y comenzar a obtener datos reales del comportamiento de los usuarios.

En el **Sprint 2** se incorporan mejoras de funcionalidad orientadas a la gestión de los leads captados. En esta etapa se implementa la integración con un sistema CRM, la clasificación automática de los leads según su interés y la construcción de un dashboard de métricas más avanzado que facilite el análisis del rendimiento de la plataforma.

Posteriormente, en el **Sprint 3**, el proyecto incorpora funcionalidades orientadas a mejorar la conversión y automatizar procesos. Se desarrollan mecanismos de automatización de mensajes de

seguimiento, se analizan las tasas de conversión generadas durante la feria y se elabora un reporte de resultados del evento que permita evaluar el impacto comercial de la plataforma.

Finalmente, en el **Sprint 4**, se plantean acciones de optimización y escalabilidad del sistema. A partir de los datos recopilados se realizan mejoras en la experiencia de usuario, optimización del formulario de registro y la implementación de estrategias de remarketing para aprovechar los leads captados y mejorar las conversiones futuras.

De esta manera, el roadmap permite visualizar cómo el producto evoluciona desde una versión mínima funcional hasta una solución digital más completa que integra captación, análisis y optimización de leads generados durante la Feria del Automóvil.

Representación Sintética del Roadmap

Fase	Entregable	Inicio	Fin
MVP	Web + Registro + Métricas básicas	01/06	14/06
Hito 1	CRM + Clasificación + Dashboard	15/06	30/06
Hito 2	Automatización + Conversión	01/07	15/07
Hito 3	Optimización + Remarketing	16/07	30/07
Hito 4	Design Sprint (validación UX)	01/08	10/08

El proyecto permite transformar la participación en la Feria del Automóvil en una experiencia digital medible, optimizando la captación y conversión de leads. La aplicación de metodologías ágiles y Design Sprint permite validar la solución antes de su implementación, reduciendo riesgos y mejorando la experiencia del usuario.

Cronograma del Proyecto (Roadmap detallado)

El siguiente cronograma presenta la planificación detallada del proyecto, incorporando fechas específicas, tareas, responsables y criterios de aceptación. Esta estructura permite visualizar de forma clara la evolución del producto y el cumplimiento de los hitos definidos.

Fase MVP – Desarrollo Base del Sistema

Inicio: 01/06
Fin: 14/06

Objetivo: Implementar la funcionalidad básica de captación de leads.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Diseño de wireframe	UX Designer	Diseño	2 días	Wireframe aprobado por PO
Desarrollo landing page	Dev	Desarrollo	3 días	Página responsive
Desarrollo formulario	Dev	Desarrollo	2 días	Formulario funcional
Integración base de datos	Dev / BI	Desarrollo	2 días	Datos almacenados correctamente
Configuración GA4	Analítica	Data	2 días	Evento registrado
Pruebas funcionales	Equipo	QA	3 días	Flujo completo validado

Hito 1 – Integración y Clasificación

Inicio: 15/06
Fin: 30/06

Objetivo: Mejorar la gestión de leads.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Integración con CRM	Dev	Desarrollo	3 días	Leads visibles en CRM
Clasificación de leads	BI	Data	2 días	Segmentación correcta
Desarrollo dashboard	BI	Data	3 días	Métricas visibles
Validación sistema	Equipo	QA	2 días	Datos correctos

Hito 2 – Automatización y Conversión

Inicio: 01/07
Fin: 15/07

Objetivo: Automatizar procesos y mejorar conversión.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Automatización de mensajes	Dev	Desarrollo	3 días	Envío automático funcionando
Configuración campañas	Marketing	Marketing	3 días	Campañas activas
Medición de conversión	Analítica	Data	2 días	Datos medibles
Reporte de resultados	BI	Data	2 días	Informe generado

Hito 3 – Optimización del Sistema

Inicio: 16/07
Fin: 30/07

Objetivo: Mejorar rendimiento y experiencia de usuario.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Optimización UX	UX Designer	Diseño	3 días	Mejora en usabilidad
Mejora del formulario	Dev	Desarrollo	2 días	Reducción de errores
Implementación remarketing	Marketing	Marketing	3 días	Campañas activas
Análisis de datos	BI	Data	2 días	Insights generados

Hito 4 – Design Sprint (Validación UX)


Inicio: 01/08
Fin: 10/08

Objetivo: Validar la experiencia de usuario antes de la versión final.

Tarea	Responsable	Equipo	Duración	Criterio de aceptación
Análisis del problema	Equipo	Todos	2 días	Problema definido
Generación de ideas	UX / Dev	Diseño	2 días	Soluciones propuestas
Selección de solución	PO	Dirección	1 día	Solución elegida
Prototipo en Figma	UX	Diseño	3 días	Prototipo funcional
Test con usuarios	UX / PO	UX	2 días	Feedback obtenido

Hitos del Proyecto

- MVP funcional: 14/06
- Hito 1 completado: 30/06
- Hito 2 completado: 15/07
- Hito 3 completado: 30/07
- Hito 4 (Design Sprint): 10/08

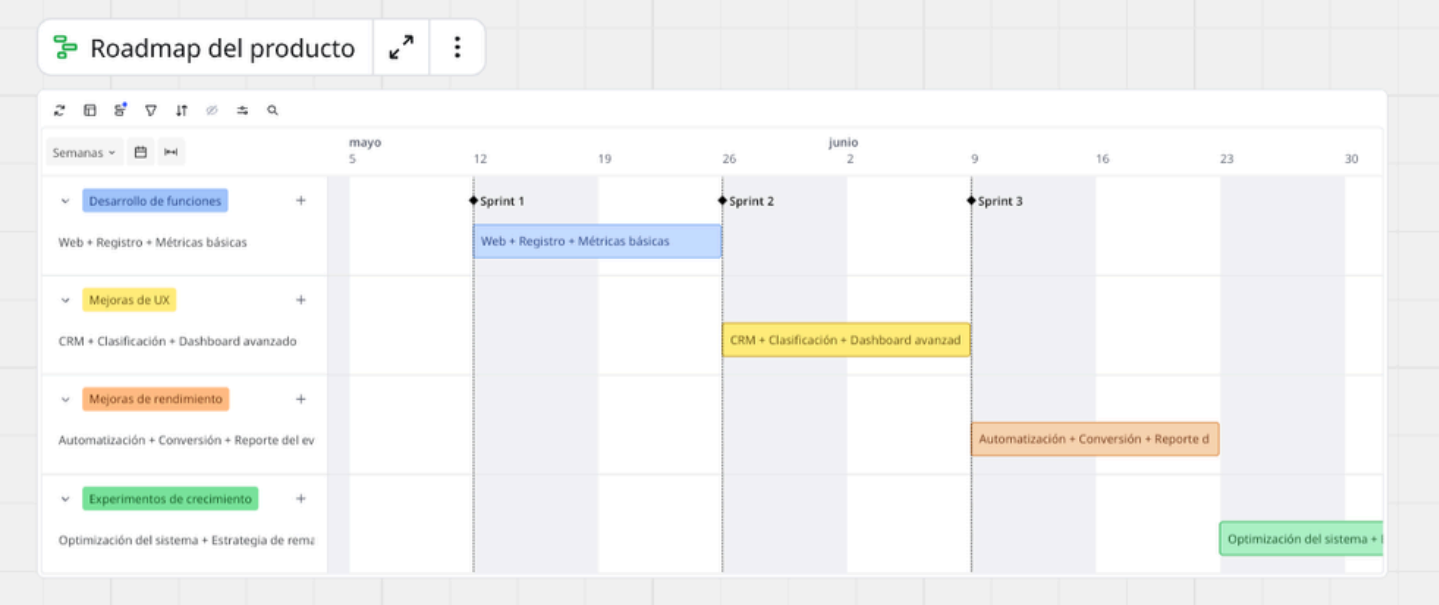

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- Registro digital de leads.
- Clasificación automática de interés.
- Integración con CRM.
- Dashboard de métricas.
- Sistema de validación de datos.

Requerimientos No Funcionales

- Plataforma responsive.
- Seguridad SSL.
- Protección de datos.
- Tiempo de carga menor a 3 segundos.
- Escalabilidad futura.

Valor Estratégico del Proyecto

La implementación de esta solución digital permitirá:

- Reducir pérdida de leads.
- Mejorar trazabilidad comercial.
- Tomar decisiones basadas en datos.
- Aumentar tasa de conversión.
- Profesionalizar la presencia en la feria.

El evento físico deja de ser solo exposición y se convierte en un punto de entrada a un ecosistema digital medible y escalable.

Selección de Metodología: Design Sprint

Para el desarrollo del proyecto **Feria Auto Leads**, se selecciona la metodología **Design Sprint**, ya que permite validar rápidamente una solución digital antes de invertir recursos en su desarrollo completo.

El Design Sprint es una metodología creada en Google Ventures por Jake Knapp que busca resolver problemas de diseño y validar ideas mediante un proceso estructurado de cinco fases: **entender,**

idear, decidir, prototipar y probar. Este proceso permite definir metas claras, explorar soluciones y probar prototipos con usuarios reales antes de iniciar el desarrollo del producto.

Semana 8 - Design Sprint

A diferencia de Design Thinking, que puede extenderse en el tiempo y centrarse principalmente en comprender al usuario, el Design Sprint se caracteriza por ser **un proceso acotado en el tiempo que permite validar ideas rápidamente** antes de comenzar el desarrollo del producto digital.

Semana 8 - Design Sprint

En el caso del proyecto desarrollado, el objetivo es validar la plataforma digital para la captación de leads durante la Feria del Automóvil. Por esta razón, Design Sprint resulta la metodología más adecuada, ya que permite diseñar un prototipo de la solución, probarlo con usuarios y obtener feedback antes de su implementación final.

Nuevo Hito Incremental del Proyecto

Hito 4 – Validación de la Plataforma Digital mediante Design Sprint

Este hito tiene como objetivo validar la experiencia de usuario de la plataforma digital destinada a registrar leads durante la Feria del Automóvil.

A través del Design Sprint se analizará cómo los visitantes interactúan con la landing page, el formulario de registro y el sistema de captación de datos. Esto permitirá identificar mejoras en la usabilidad del sistema antes de su implementación definitiva.

Fases del Design Sprint

El Design Sprint se estructura en cinco fases que permiten avanzar desde la comprensión del problema hasta la validación de la solución con usuarios reales. Este proceso facilita la toma de decisiones basada en evidencia y reduce el riesgo antes del desarrollo final del producto.

Fase 1 – Entender

En esta fase el equipo analiza el problema, el contexto del proyecto y define los objetivos del producto digital.

En el caso de “Feria Auto Leads”, se identifican las dificultades actuales en la captación y registro de leads durante eventos presenciales, como la falta de trazabilidad y la ausencia de herramientas digitales.

Participantes:

- Product Owner

- Scrum Master
- Desarrollador Web
- UX/UI Designer
- Analista de datos

Herramientas:

- Miro
- Mapas de experiencia del usuario
- Diagramas de flujo

Resultado esperado:
Definición clara del problema, objetivos del producto y necesidades del usuario.

Fase 2 – Idear

En esta fase el equipo genera posibles soluciones para resolver el problema identificado.

Se plantean distintas alternativas de diseño para la landing page, el formulario y el flujo de registro de leads.

Actividades:

- Brainstorming de soluciones
- Diseño de wireframes
- Definición del flujo de usuario

Participantes:

- UX/UI Designer
- Desarrollador Web
- Product Owner

Herramientas:

- Miro
- Figma

Resultado esperado:
Generación de múltiples propuestas de solución enfocadas en mejorar la captación de leads.

Fase 3 – Decidir

En esta etapa el equipo evalúa las soluciones propuestas y selecciona la más adecuada para desarrollar.

Actividades:

- Análisis de alternativas
- Selección del flujo más eficiente
- Definición de funcionalidades del prototipo

Participantes:

- Product Owner
- Scrum Master
- UX Designer

Herramientas:

- Matriz de priorización
- Votación por puntos

Resultado esperado:
Definición de la solución que será prototipada.

Fase 4 – Prototipar

En esta fase se construye un prototipo funcional que permita simular el uso de la plataforma.

Actividades:

- Diseño de la landing page
- Creación del formulario
- Simulación del flujo de registro

Participantes:

- UX/UI Designer
- Desarrollador Web

Herramientas:

- Figma
- Prototipo interactivo

Resultado esperado:
Prototipo navegable que represente el funcionamiento del sistema.

Fase 5 – Probar

En esta etapa el prototipo se valida con usuarios reales para evaluar su funcionamiento y detectar mejoras.

Actividades:

- Pruebas de usabilidad
- Observación del comportamiento de los usuarios
- Recolección de feedback

Participantes:

- Usuarios de prueba

- Product Owner
- UX Designer

Herramientas:

- Entrevistas
- Encuestas
- Grabación de sesiones

Resultado esperado:
Validación del prototipo y detección de mejoras antes de su desarrollo final.


Metodologia Kanban

En el marco del desarrollo de la plataforma digital “Feria Auto Leads”, se implementa un tablero Kanban como herramienta complementaria para la gestión y organización de las tareas del equipo de trabajo.

Si bien la metodología principal seleccionada para la validación del producto es Design Sprint, el uso de Kanban permite gestionar operativamente el avance de las actividades vinculadas al desarrollo de la solución digital, particularmente aquellas relacionadas con la creación de la landing page, el formulario de registro, la integración de la base de datos y la configuración de herramientas de analítica.

El tablero se estructura en columnas que representan el estado de las tareas (*Backlog, To Do, In Progress, Review y Done*), facilitando la visualización del flujo de trabajo, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del progreso del proyecto.

De esta manera, el Kanban actúa como una herramienta de apoyo que complementa la metodología principal, permitiendo mejorar la organización del equipo y asegurar la correcta ejecución de las tareas necesarias para la implementación del MVP y los hitos definidos dentro del proyecto.

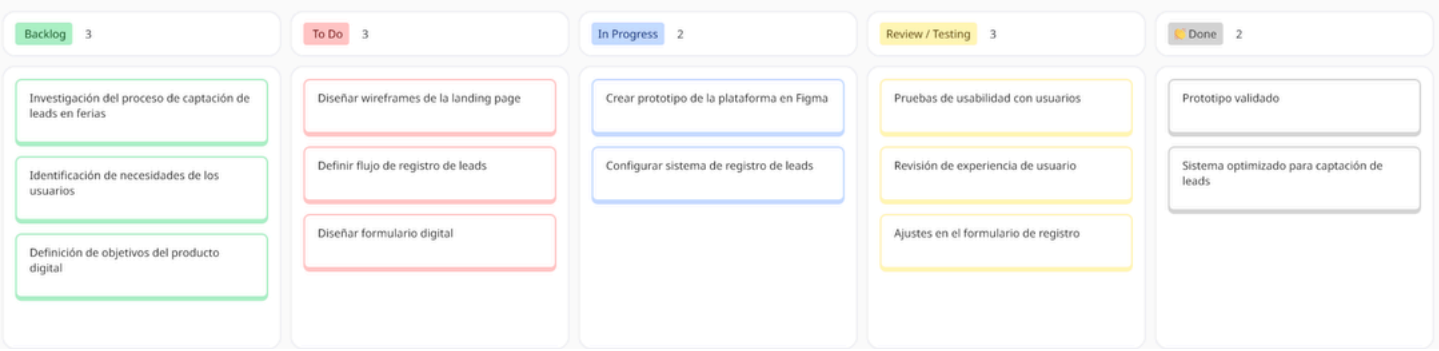

El tablero Kanban permite visualizar el estado de las tareas, facilitar la organización del trabajo y mejorar la gestión del flujo dentro del equipo ágil durante el desarrollo del proyecto.

CONCLUSIÓN

El proyecto permite transformar la participación en la Feria del Automóvil en una experiencia digital medible, optimizando la captación y conversión de leads. La aplicación de metodologías ágiles y Design Sprint permite validar la solución antes de su implementación, reduciendo riesgos y mejorando la experiencia del usuario.
